【別紙3　デザイン制作・監修に係る制作スケジュール】

	開始	終了
デザイン開発	2017/10/19	2017/12/8
ホーム	2017/10/19	2017/10/27
第二・三階層のページ	2017/10/19	2017/10/27
第四階層以下のページとテンプレート	2017/10/30	2017/11/10
First-timer	2017/11/6	2017/11/10
お気に入り／ささっと機能	2017/10/30	2017/11/10
デザインガイドライン	2017/11/6	2017/11/17
ストックフォト&機能設置ページ・パーツ	2017/11/20	2017/12/8
フロントエンド開発	2017/10/30	2017/12/29
ホーム	2017/10/30	2017/11/17
トラベルディレクトリ	2017/10/30	2017/11/17
エリア一覧	2017/10/30	2017/11/17
トピック一覧	2017/10/30	2017/11/17
エリア紹介	2017/10/30	2017/11/17
スポット紹介	2017/10/30	2017/11/17
ストーリー記事	2017/10/30	2017/11/17
ガイド	2017/11/13	2017/11/24
ベーシック	2017/11/13	2017/11/24
ベーシック(B2B)	2017/11/13	2017/11/24
First-timer	2017/11/20	2017/11/24
お気に入り／ささっと機能	2017/11/13	2017/12/1
ストックフォト&機能モジュール	2017/12/11	2017/12/29
インフラ構築	2017/9/25	2018/2/28
設計コンサルティング	2017/9/25	2017/10/6
開発用サーバー構築	2017/10/10	2017/10/13
エンタープライズUGC(Chute)設計	2017/10/30	2017/12/18
エンタープライズUGC(Chute)システム組込み	2018/1/1	2018/2/9
DAM (Cloudinary)設計	2017/9/25	2017/10/20
DAM (Cloudinary)システム組込み	2017/10/23	2017/11/17
本番用サーバー構築	2018/2/26	2018/2/28
サイト移行計画	2018/2/1	2018/2/28
バックエンド開発	2017/9/14	2017/12/29
データ設計	2017/9/14	2017/9/22
要件定義:CMS	2017/9/25	2017/10/6
要件定義:読み上げ機能	2017/10/2	2017/10/6
要件定義:プッシュ／お知らせ系	2017/10/2	2017/10/6
要件定義:問い合わせ／エラー報告	2017/10/2	2017/10/6
要件定義:トラベルディレクトリ&検索	2017/10/10	2017/10/13
要件定義:お気に入り／ささっと機能	2017/10/10	2017/10/20
要件定義:CMSの財団チェック	2017/10/10	2017/10/20
要件定義:宿泊予約API	2017/10/23	2017/11/17
要件定義:ストックフォト	2017/11/20	2017/12/1
開発:CMS&財団側管理機能	2017/9/25	2017/11/17
開発:トラベルディレクトリ&検索	2017/11/13	2017/11/17
開発:宿泊予約API	2017/11/20	2017/11/24
開発:お気に入り／ささっと機能	2017/11/20	2017/12/1
開発:読み上げ機能	2017/11/27	2017/12/1
開発:プッシュ／お知らせ系	2017/11/27	2017/12/1
開発:問い合わせ／エラー報告	2017/11/27	2017/12/1
開発:ストックフォト	2017/12/4	2017/12/29
コンテンツ開発：写真撮影	2017/10/16	2018/2/28
エリア撮影ロケハン	2017/10/16	2017/11/24
撮影プラン／日程調整	2017/10/17	2017/11/2
撮影期間	2017/10/18	2018/2/28
撮影データ最終納品期日	2018/2/28	2018/2/28
QA/QC（品質保証／管理）	2018/2/12	2018/3/21
社内テスト	2018/2/12	2018/2/23
第三者機関(LAC)テスト	2018/3/1	2018/3/14
修正／最終調整	2018/3/15	2018/3/21

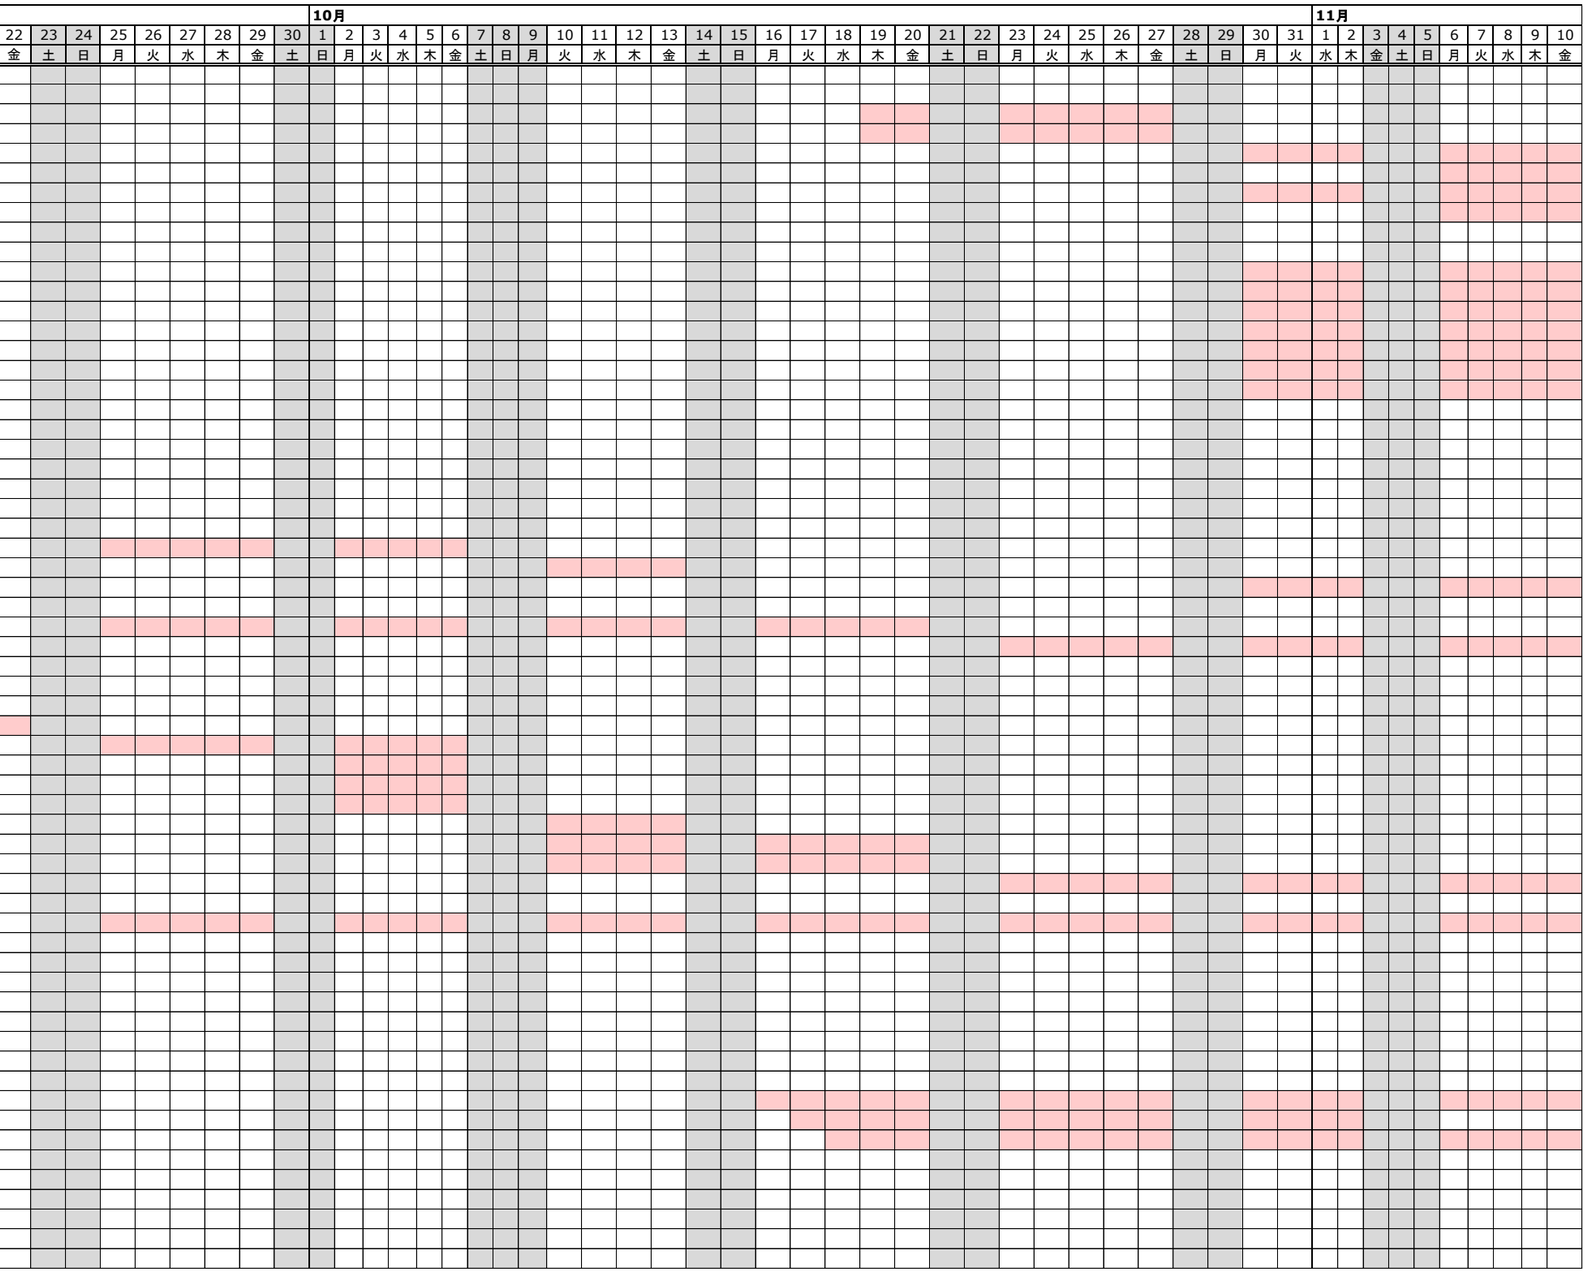

【別紙3　デザイン制作・監修に係る制作スケジュール】

	開始	終了	11月 11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	12月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
デザイン開発	2017/10/19	2017/12/8
ホーム	2017/10/19	2017/10/27
第二・三階層のページ	2017/10/19	2017/10/27
第四階層以下のページとテンプレート	2017/10/30	2017/11/10
First-timer	2017/11/6	2017/11/10
お気に入り／ささっと機能	2017/10/30	2017/11/10
デザインガイドライン	2017/11/6	2017/11/17
ストックフォト&機能設置ページ・パーツ	2017/11/20	2017/12/8
フロントエンド開発	2017/10/30	2017/12/29
ホーム	2017/10/30	2017/11/17
トラベルディレクトリ	2017/10/30	2017/11/17
エリア一覧	2017/10/30	2017/11/17
トピック一覧	2017/10/30	2017/11/17
エリア紹介	2017/10/30	2017/11/17
スポット紹介	2017/10/30	2017/11/17
ストーリー記事	2017/10/30	2017/11/17
ガイド	2017/11/13	2017/11/24
ベーシック	2017/11/13	2017/11/24
ベーシック(B2B)	2017/11/13	2017/11/24
First-timer	2017/11/20	2017/11/24
お気に入り／ささっと機能	2017/11/13	2017/12/1
ストックフォト&機能モジュール	2017/12/11	2017/12/29
インフラ構築	2017/9/25	2018/2/28
設計コンサルティング	2017/9/25	2017/10/6
開発用サーバー構築	2017/10/10	2017/10/13
エンタープライズUGC(Chute)設計	2017/10/30	2017/12/18
エンタープライズUGC(Chute)システム組込み	2018/1/1	2018/2/9
DAM (Cloudinary)設計	2017/9/25	2017/10/20
DAM (Cloudinary)システム組込み	2017/10/23	2017/11/17
本番用サーバー構築	2018/2/26	2018/2/28
サイト移行計画	2018/2/1	2018/2/28
バックエンド開発	2017/9/14	2017/12/29
データ設計	2017/9/14	2017/9/22
要件定義:CMS	2017/9/25	2017/10/6
要件定義:読み上げ機能	2017/10/2	2017/10/6
要件定義:プッシュ／お知らせ系	2017/10/2	2017/10/6
要件定義:問い合わせ／エラー報告	2017/10/2	2017/10/6
要件定義:トラベルディレクトリ&検索	2017/10/10	2017/10/13
要件定義:お気に入り／ささっと機能	2017/10/10	2017/10/20
要件定義:CMSの財団チェック	2017/10/10	2017/10/20
要件定義:宿泊予約API	2017/10/23	2017/11/17
要件定義:ストックフォト	2017/11/20	2017/12/1
開発:CMS&財団側管理機能	2017/9/25	2017/11/17
開発:トラベルディレクトリ&検索	2017/11/13	2017/11/17
開発:宿泊予約API	2017/11/20	2017/11/24
開発:お気に入り／ささっと機能	2017/11/20	2017/12/1
開発:読み上げ機能	2017/11/27	2017/12/1
開発:プッシュ／お知らせ系	2017/11/27	2017/12/1
開発:問い合わせ／エラー報告	2017/11/27	2017/12/1
開発:ストックフォト	2017/12/4	2017/12/29
コンテンツ開発：写真撮影	2017/10/16	2018/2/28
エリア撮影ロケハン	2017/10/16	2017/11/24
撮影プラン／日程調整	2017/10/17	2017/11/2
撮影期間	2017/10/18	2018/2/28
撮影データ最終納品期日	2018/2/28	2018/2/28
QA/QC (品質保証／管理)	2018/2/12	2018/3/21
社内テスト	2018/2/12	2018/2/23
第三者機関(LAC)テスト	2018/3/1	2018/3/14
修正／最終調整	2018/3/15	2018/3/21
